

台風 11 号、12 号、14 号が連続して襲来

8月31日(水)に大東島地方へ襲来した台風 11 号は、9月3日(土)には先島諸島を通過し、沖縄本島地方も暴風域に巻き込みました。9月11日(日)には台風12号が先島諸島へ襲来、9月17日(土)には台風14号が大東島地方へ接近するなど、当社設備に多くの被害をもたらしました。


3週連続しての台風襲来となりましたが、本島より各地へ事前派遣を行うなど、当社、関係会社、電気工事会社(協力会社)が一体となり、復旧作業に取り組みました。

台風 11 号 経路および特徴

8月28日(日)15時に発生した台風11号は、日本の南の海上を西に進みながら次第に発達し、8月30日(火)21時に猛烈な勢力となり、勢力を維持したまま8月31日(水)6時には大東島地方にかなり接近しました。

その後、沖縄の南で一旦停滞したのち、9月4日(日)0時には大型で強い勢力で北に進み、宮古島と石垣島の間を通過し、沖縄本島及び久米島を巻き込みながら北上しました。

暴風域に入った時間帯は、大東島地方が8月31日(水)3時頃から約6時間、宮古島地方が9月3日(土)14時頃から約25時間、八重山地方が同日13時頃から約19時間、沖縄本島地方が9月4日(日)6時頃から18時間でした。

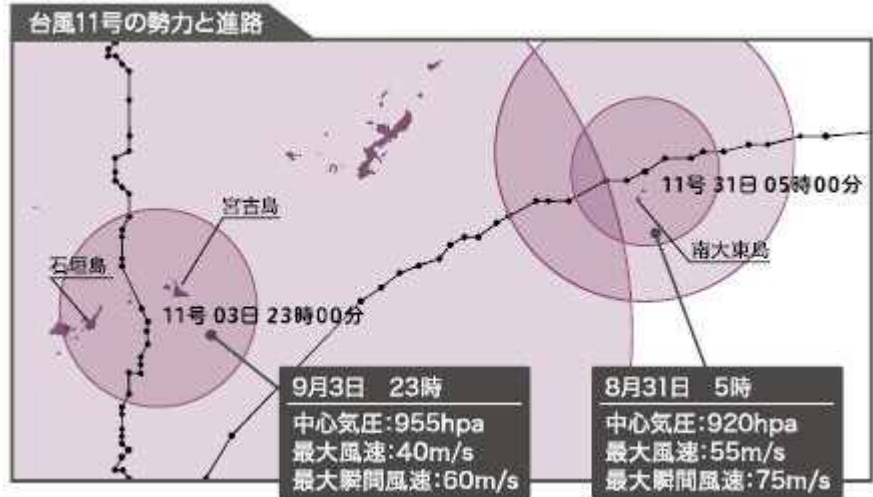

●設備被害状況

発電：新多良間 8 号機運転不可

配電：

電線断線[高圧] 15 条・スパン

電線断線[低圧] 14 条・スパン

柱上変圧器破損 34 台

高圧バインド、碍子破損 352 箇所

最大停電戸数：6,340 戸(9/4 12:00)

●復旧要員派遣

事前派遣

①周辺離島等への事前派遣 52名

②宮古・八重山支店への事前派遣 44名

事後派遣

①北大東島への事後派遣 8名

②宮古支店への事後派遣 13名


台風12号

経路および特徴

9月8日(木)9時に発生した台風12号は発達しながら北西に進み、9月11日(日)3時には石垣島の南南東約260kmで非常に強い勢力まで発達しました。

その後ゆっくりと北上し、9月12日(月)9時に石垣島の南約40kmで強い勢力となって石垣島付近を通過しました。

暴風域に入った時間帯は、宮古島地方が12日(月)1時頃から約34時間、八重山地方が11日(日)17時頃から約41時間でした。

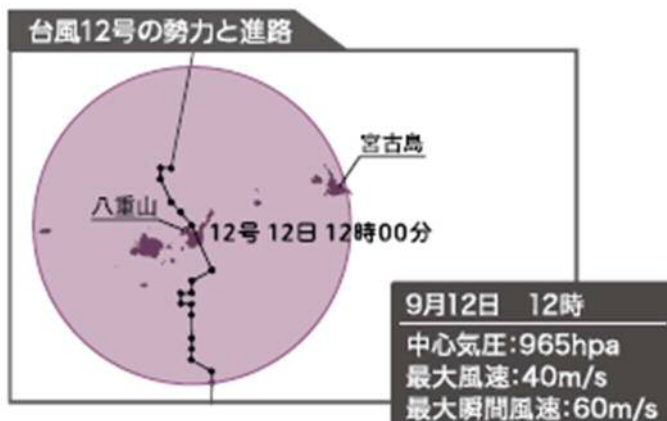

●設備被害状況

配電:

電線断線[高圧] 8条・スパン

電線断線[低圧] 7条・スパン

高圧バインド、碍子破損 316箇所

最大停電戸数: 7,800戸(9/13 03:00)

●復旧要員派遣

事前派遣

①周辺離島等への事前派遣 12名

②宮古・八重山支店への事前派遣 35名

事後派遣

①八重山支店への事後派遣 6名

②西表島への事後派遣 3名


台風14号

経路および特徴

9月14日(水)3時に発生した台風14号は、17日3時には中心気圧が910hpaの猛烈な台風になりました。

勢力を維持したまま、17日15時ごろ、南大東島の北東約160kmに接近しその後も北西へ進み、大東島地方から次第に遠ざかりました。

暴風域に入った時間は、17日13時頃から約6時間でした。

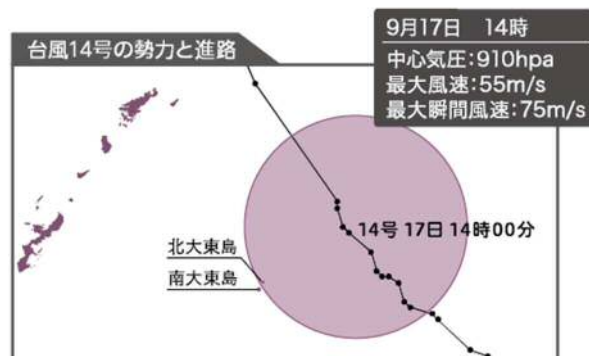

●設備被害状況

設備被害無し

高圧配電線路の停電なし

●復旧要員派遣

事前派遣

南北大東島への事前派遣 9名
