

台風 13 号が宮古島地方へ、17 号が本島地方へ襲来 総動員で復旧作業に取り組む！


9月5日(木)に、台風13号が宮古島地方へ、9月21日(土)には台風17号が本島地方へ襲来し、当社設備に多くの被害をもたらしました。

当社、関係会社、電気工事会社(協力会社)の職員総動員で早期復旧を目指し、昼夜継続して作業を行いました。

台風 13 号

9月2日(月)9時にフィリピンの東で発生した台風13号は、5日(木)3時に非常に強い勢力となり、同日昼過ぎには宮古島にかなり接近しました。その後、勢力を維持しながら北上を続け、6日(金)には久米島の西を通過しました。

宮古島地方が約20時間、石垣島地方が約11時間、久米島が約7時間暴風域に入り、最大瞬間風速は、宮古島市で59.6m/s(5日、12:15)、下地島空港で58.1m/s(5日、13:08)を観測しました。

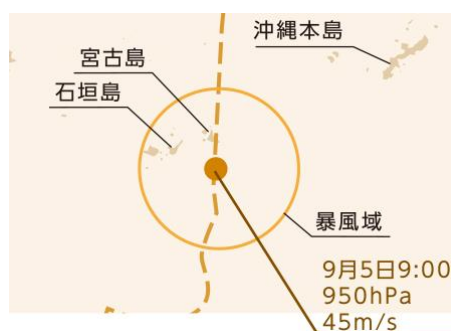

●設備被害状況

発電：被害なし

送電：被害なし

変電：被害なし

配電：電柱破損(折損・倒壊)	7本
電線断線(高圧)	12条・スパン
電線断線(低圧)	62条・スパン
柱上変圧器破損	9台
碍子破損等 ^{※1}	約1,190箇所

※1: 高圧バインド、高圧碍子

最大停電戸数：20,590戸(9/5 21:00)

●復旧要員派遣

事前派遣

- | | |
|--------------|-----|
| ①沖縄本島から周辺離島へ | 24名 |
| ②沖縄本島から宮古支店へ | 17名 |


事後派遣

- | | |
|---------------|-----|
| ①沖縄本島から宮古支店へ | 83名 |
| ②八重山支店から宮古支店へ | 18名 |

台風 17 号

9 月 19 日(木)15 時に沖縄の南で発生した大型の台風 17 号は、21 日(土)さらに発達しながら暴風域を広げ、同日 6 時には強い勢力となって久米島の南南西海上を北北西へ通過しました。

宮古島地方が約 10 時間、沖縄本島地方が約 17 時間暴風域に入り、最大瞬間風速は、渡嘉敷島で 47.7m/s(21 日、4:54)、那覇市樋川で 41.1m/s(21 日、3:55)を観測しました。

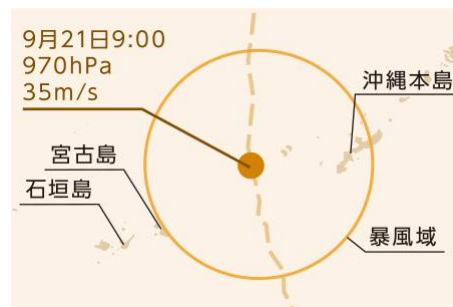

●設備被害状況

発電：被害なし

送電：被害なし

変電：被害なし

配電：電柱破損(折損・倒壊) 1本

電線断線(高圧) 50条・スパン

電線断線(低圧) 12条・スパン

柱上変圧器破損 16台

碍子破損等^{※1} 約 186箇所

※1:高圧バインド、高圧碍子

最大停電戸数：39,900戸(9/21 10:00)

●復旧要員派遣

事前派遣

①沖縄本島から周辺離島へ 13名

事後派遣

①宮古支店・八重山支店から沖縄本島へ 12名

②沖縄本島から座間味島・阿嘉島へ 6名

●復旧に向けた取り組み



引込線の復旧作業(台風 13 号)




宮古島への応援派遣には(株)沖電工大嶺社長も
激励に駆けつけました(台風 13 号)



高所作業車での復旧作業(台風 17 号)



昼夜継続した復旧作業(台風 17 号)



宮古島の小学生からお礼のお手紙を
いただきました
